กลุ่มงาน/งาน	กลุ่มงานประมาณราคา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงลพบุรี - ปากน้ำโพ
สถานที่ก่อสร้าง	สัญญาที่ 1 ช่วงบ้านกลับ - โคกกะเทียม (ทางรถไฟยกระดับ)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท) กระทรวงคมนาคม
ประมาณการโดยบริษัท	กิจการร่วมค้า ยูเอ็น-เอสเอช

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)
บริษัท เอสพีเอ อาร์คิเตคส์ แอนด์ เปลนเนอร์ จำกัด
บริษัท ดาวกูกส์ คอนซูลติ้งเต็นส์ จำกัด

BILL NO	DESCRIPTION	CONTRACT AMOUNT (Baht)	(%)	Year / Month	Accumulative
1	GENERAL REQUIREMENTS	57,037,492.29	0.57%	Plan	32.12%
				Actual	32.40%
2	EARTHWORKS	50,513,474.00	0.50%	Plan	27.83%
				Actual	14.70%
3	ROAD AND STATION YARDS	41,737,672.06	0.42%	Plan	0.00%
				Actual	0.00%
4	STRUCTURE	6,699,218,421.95	66.66%	Plan	13.43%
				Actual	1.04%
4A	Elevated Railway	4,797,804,591.13	47.74%	Plan	2.08%
				Actual	0.11%
4B	Balance Cantilever	109,769,713.82	1.09%	Plan	9.28%
				Actual	0.00%
4C	Railway Bridge	1,924,628.00	0.02%	Plan	79.79%
				Actual	0.00%
4D	U-TURN BRIDGE	106,777,040.00	1.06%	Plan	0.00%
				Actual	0.00%
4J	Pile and Testing	1,682,942,449.00	16.75%	Plan	46.84%
				Actual	2.54%
5	BUILIDINGS	739,031,491.47	7.35%	Plan	17.58%
				Actual	1.07%
5.101	BAN KLAP STATION	46,574,940.00	0.46%	Plan	0.00%
				Actual	0.00%
5.102	BYPASS LOP BURI-1 STATION	38,803,018.00	0.39%	Plan	0.00%
				Actual	0.00%
5.103	BYPASS LOP BURI-2 STATION	653,653,533.47	6.50%	Plan	19.87%
				Actual	1.21%
6	PIPE AND DRAINAGE	16,373,205.12	0.16%	Plan	54.19%
				Actual	0.00%
7	UTILITIES	7,546,500.00	0.08%	Plan	0.00%
				Actual	0.00%
8	TRACKWORKS : BYPASS	1,148,397,743.11	11.43%	Plan	0.00%
				Actual	17.67%
10	PROVISIONAL SUMS	1,290,144,000.00	12.84%	Plan	11.83%
				Actual	0.00%
10.201	Balance Cantilever(2 Locations)	108,818,000.00	1.08%	Plan	8.10%
				Actual	0.00%
	Total (Contract Amount Excluding Provisional Sum and VAT.:)	10,050,000,000	100%		

		2018 / 2561						2019 / 2562											
		Jun-July	Aug 18	Sep 18	Oct 18	Nov 18	Dec 18	Jan 19	Feb 19	Mar 19	Apr 19	May 19	Jun 19	Jul 19	Aug 19	Sep 19	Oct 19	Nov 19	Dec 19
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Plan WP Rev.0	% Progress of work	0.01%	0.06%	0.46%	0.53%	1.02%	1.34%	1.48%	1.53%	1.66%	2.01%	2.08%	[illegible]	[illegible]	3.05%	3.11%	2.97%	2.67%	2.89%
	% AccumulativeProgress of work	0.01%	0.07%	0.53%	1.06%	2.08%	3.42%	4.90%	6.42%	8.08%	10.09%	12.17%	[illegible]	[illegible]	21.14%	24.25%	27.22%	29.89%	32.78%
	Total Amount (MB)	0.9	6.5	45.8	52.8	102.9	134.6	149	154	167	202	[illegible]	[illegible]	[illegible]	307	312	299	268	290
	Accumulative Total Amount (MB)	0.9	8.4	54.1	107.0	209.9	344.5	493	647	813	1,015	1,224	1,514	1,819	2,126	2,438	2,737	3,004	3,295
Actual Progr	% Progress of Works	0.03%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.01%	0.02%	0.104%	0.088%	0.153%	2.156%	0.457%						
	% Accumulative Progress of works	0.03%	0.03%	0.04%	0.05%	0.05%	0.07%	0.09%	0.195%	0.283%	0.436%	2.592%	3.049%						
	Total Amount (MB)	2.7	0.6	0.9	0.5	0.7	1.3	2.5	10.5	8.8	15.3	216.7	45.9						
	Accumulative Total Amount (MB)	2.7	3.3	4.2	4.7	5.4	6.6	9.1	19.6	28.4	43.7	260.4	306.3						

		2020/ 2563												2021/2564					
		Jan 20	Feb 20	Mar 20	Apr 20	May 20	Jun 20	Jul 20	Aug 20	Sep 20	Oct 20	Nov 20	Dec 20	Jan 21	Feb 21	Mar 21	Apr 21	May 21	Jun 21
		19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
Plan WP Rev.0	% Progress of work	3.05%	3.15%	2.99%	2.68%	2.40%	2.47%	2.36%	2.16%	2.21%	2.30%	2.27%	2.23%	2.21%	2.20%	2.11%	1.78%	1.83%	1.80%
	% AccumulativeProgress of work	35.82%	38.97%	41.96%	44.63%	47.04%	49.51%	51.87%	54.04%	56.24%	58.55%	60.82%	63.05%	65.26%	67.46%	69.58%	71.36%	73.19%	75.00%
	Total Amount (MB)	306	316	301	269	242	249	237	218	222	231	228	224	222	221	212	179	184	181
	Accumulative Total Amount (MB)	3,601	3,917	4,218	4,487	4,728	4,977	5,214	5,432	5,653	5,885	6,113	6,338	6,560	6,781	6,993	7,173	7,357	7,538
Actual Progr	% Progress of Works																		
	% Accumulative Progress of works																		
	Total Amount (MB)																		
	Accumulative Total Amount (MB)																		
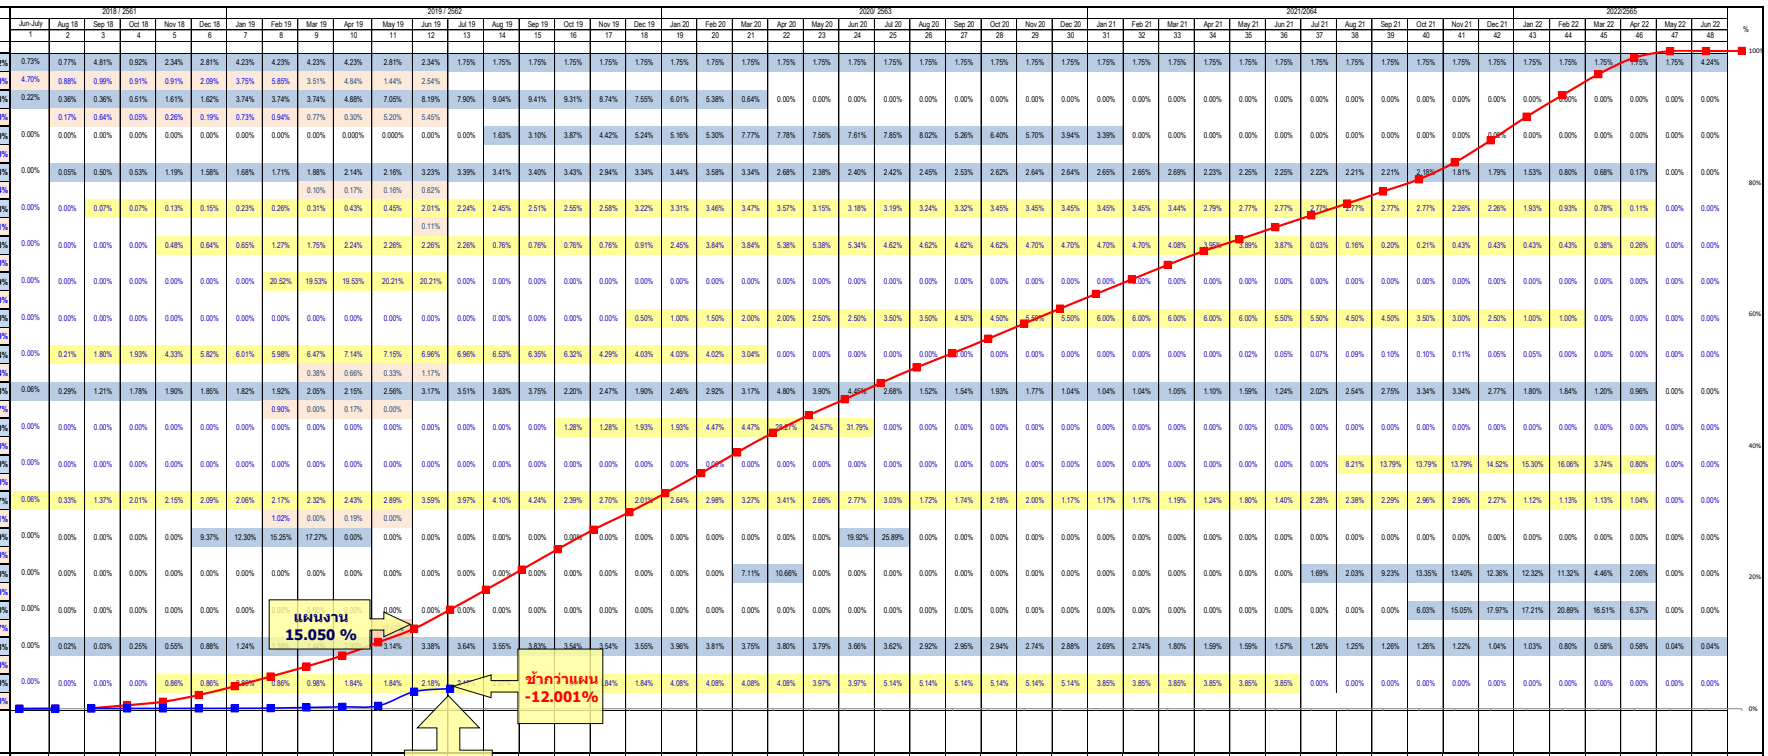
		2021/2564												2022/2565					
		Jul 21	Aug 21	Sep 21	Oct 21	Nov 21	Dec 21	Jan 22	Feb 22	Mar 22	Apr 22	May 22	Jun 22	%
		37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	
Plan WP Rev.0	% Progress of work	1.80%	1.83%	1.86%	2.57%	3.35%	3.60%	3.27%	3.18%	2.51%	1.00%	0.01%	0.03%	
	% AccumulativeProgress of work	76.79%	78.62%	80.48%	83.05%	86.40%	90.00%	93.27%	96.44%	98.96%	99.96%	99.97%	100.00%	
	Total Amount (MB)	181	184	186	258	336	362	329	319	253	100	1	2	
	Accumulative Total Amount (MB)	7,719	7,903	8,089	8,347	8,684	9,046	9,374	9,694	9,946	10,047	10,048	10,050	
Actual Progr	% Progress of Works													
	% Accumulative Progress of works													
	Total Amount (MB)													
	Accumulative Total Amount (MB)
